

市立秋田総合病院 立体駐車場建設工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2019年12月号

工事進捗状況および工事工程表

周囲を覆っていた外部足場が徐々に取り外され、立体駐車場が姿を現し始めました。今月は1階の舗装工事やエレベーターの設置工事を行います。また、立体駐車場屋上と現病院を連絡する仮設渡り廊下についても鉄骨工事を開始しており、下旬には完成に近い姿まで工事が進む予定です。


工事完成まで残り数ヶ月。引き続き安全第一で作業を進めてまいりますので、今後ともよろしくお願いたします。

工事項目	11月		12月																																						
	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
資材等運搬	10台/日																																								
立体駐車場	外構工事	下層路盤	舗装部下層路盤							融雪ヒーター						アスファルト舗装						アスファルト舗装																			
	設備工事	配管取付	管制装置基礎							配管取付						配管取付						エレベーター設置						エレベーター設置													
渡り廊下棟	鉄骨建方		デッキ							屋根・外壁張						屋根・外壁張					足場撤去																				
			ワイヤーメッシュ敷込							Con打設 (テック)					サッシ・三方枠他						内装下地						内装仕上														


年末年始休暇
1月3日迄

仮設渡り廊下について（完成後）

立体駐車場から現病院へは、下図のとおり『仮設渡り廊下』をご利用いただくこととなります。

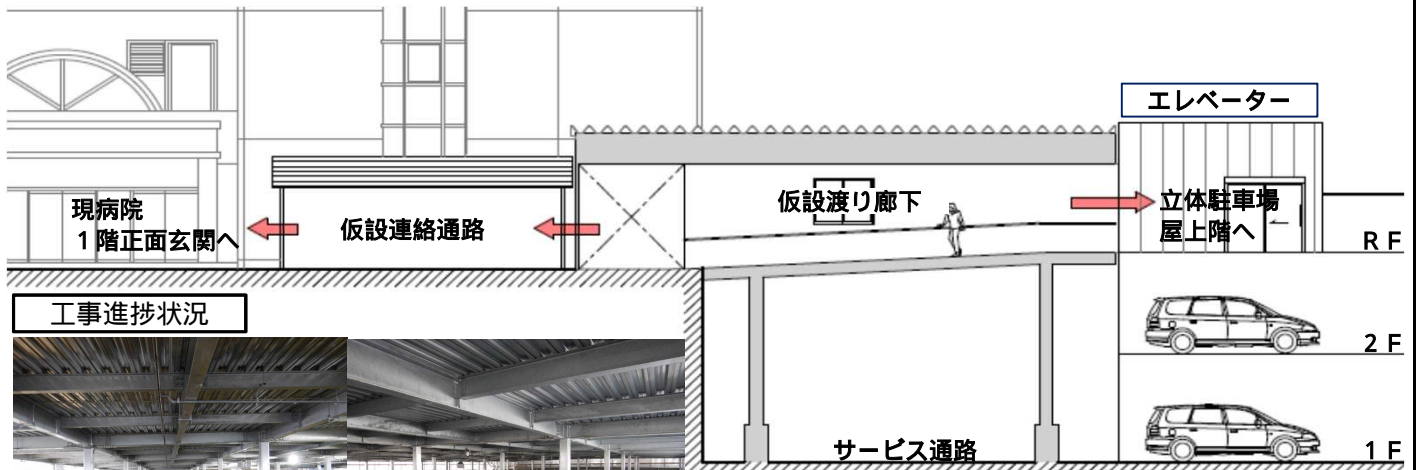

工事進捗状況

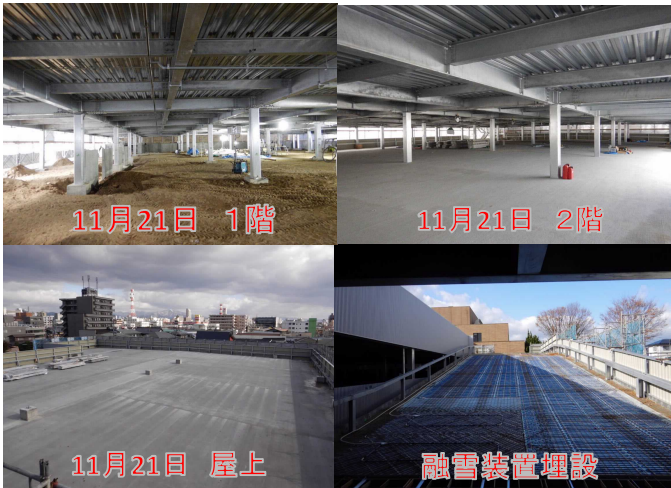

今後の工事のお知らせ



12月上旬から立体駐車場の入口整備のため、上記赤枠部分および現場ゲート前付近において、道路の掘削工事を行います。工事期間中は片側交通となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

現場事務所を移転します。

11/29以降、現場事務所が元の第1駐車場南側の敷地に戻ります。工事に関するお問い合わせは、これまで通り、下記連絡先へお願いします。

中田・中山・粟野建設工事共同企業体
現場事務所 080-8200-8090

工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けいたします。次回の発行は12月末を予定しております。
