

市立秋田総合病院 新病院建設

工事かわら版

■工事状況


定点写真（4/23撮影）

前月に引き続き、地上躯体工事が順調に進んでおり、現在は4階部分を築造しております。また、大型連休明けからは1～3階の建物内部についても、内装や設備工事を開始します。これにより、新病院建設に従事する作業員が増えますが、通勤災害等が起こらぬよう、現場周辺の安全・環境配慮に十分努めてまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。



■医療支援棟の工事を開始しました。

4/12より医療支援棟の工事に着手しました。医療支援棟は4階建てのため、医療棟と同様、年内の上棟を目指します。また、現在の工事状況ですが、構造物の撤去工事が終了し掘削工事を行っており、5月中旬頃からは山留工事を開始する予定です。引き続き、工事の進捗状況や工事予定を、医療棟と併せて本紙でお知らせしてまいります。

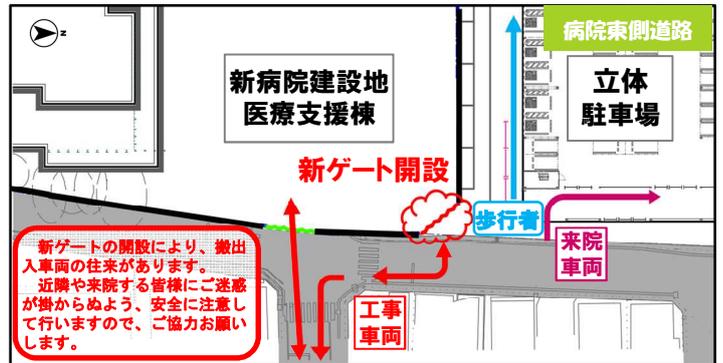

■工事予定

進捗状況および天候によって、予定から工事内容が変更する場合があります。
*コンクリートの打設量に応じて、作業時間が朝7時から夜19時までとなる場合もありますので、ご了承ください。

| 【医療棟】 工事項目 | 4月 | | | | | 5月 | | | | | | | | | | | | | | | 6月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|----|----|----|----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|
| | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 仮設工事 | 外部足場・内部足場組立工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンクリート躯体工事 (8時~17時) | 配筋工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 型枠工事 ← GW閉所 → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄骨躯体工事 | コンクリート打設 | | | | | コンクリート打設 | | | | | | | | | | コンクリート打設 | | | | | 鉄骨建方工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【医療支援棟】 山留工事 | | | | | | 根切工事 | | | | | | | | | | 山留工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

すべては患者さんの「笑顔」のために！

工事かわら版を毎月発行します。次回は5月下旬です。
発行：清水・佐々木・長谷駒・羽後・ヌノタニJV
工事のお問合せは 018-838-6061 へどうぞ
