


# 市立秋田総合病院 新病院建設

# 工事かわら版

## ■工事状況

現在、医療棟8階までの鉄骨建方工事を行っており、現病院に並ぶ高さとなっています。また、コンクリート躯体工事は3階床まで打設が完了しており、4階部分の鉄筋組立作業に入りました。今後も、鉄骨→鉄筋コンクリートの順に建ち上げていき、年内中に最上階である13階までの躯体完了を目指します。

また、4月から新たに医療支援棟の工事に着手するため、工事区画を拡張します。これにより、敷地内の通行ルートが変更になると同時に、トラックや生コン車等の工事車両の通行が多くなります。引き続き安全に配慮し工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

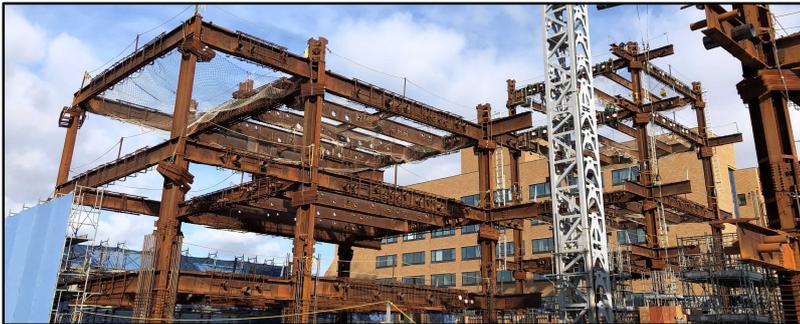

## ■通行ルート変更のお知らせ



4/12(月)から敷地内の通行ルートが変更になります。

- ▶ 東側(新国道側)への車両の通り抜けができなくなります。
- ▶ 東側からの歩行者は、立体駐車場のエレベーターを利用し、正面出入口にお進みください。

## ■外装モックアップ



モックアップとは検討や確認のために試作する「模型」のことです。今回は低層部分の外装モックアップを作成し、外装材や窓の質感、色などを確認しました。

## ■工事予定

進捗状況および天候によって、予定から工事内容が変更する場合があります。  
\*コンクリートの打設量に応じて、作業時間が朝7時から夜19時までとなる場合もありますので、ご了承ください。

工事項目	3月			4月																	5月																					
	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
仮設工事	外部足場・内部足場組立工事											仮囲拡張工事																														
コンクリート躯体工事 (8時~17時)	配筋工事																																									
	型枠工事																																									
				コンクリート打設																	コンクリート打設																					

すべては患者さんの「笑顔」のために!

工事かわら版を毎月発行します。次回は4月下旬です。  
発行：清水・佐々木・長谷駒・羽後・ヌノタニJV  
工事のお問合せは 018-838-6061 へどうぞ
