

市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2023年6月号

■ 工事進捗および工程表

3月から開始した診療棟の上屋取壊しが5月末に完了し、6月上旬からは診療棟の地下階取壊し、中旬以降からは病棟の取壊し作業を進めていきます。また、建物の解体によって発生したコンクリートの廃材を再生砕石として埋め戻すため、重機でコンクリートを細かく破碎する作業も並行して行います。近隣の皆様には引き続きご迷惑をおかけしますが、これまで同様、振動・騒音の軽減に努めながら進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事項目	5月				6月																													
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
診療棟	外周養生足場解体																																	
	上屋取壊し																																	
					地下取壊し・埋め戻し（スラブ解体、コア抜き）																													
病棟	外部養生足場組																																	
					屋上防水剥取り・取壊し準備													屋上部から取壊し開始																
																		外壁PC版取外し																
	届出対象特定工事（カーテンウォール付加板除去）																																	




診療棟 解体状況



病棟 外部養生足場組

● 振動・騒音の大きさについて

当現場では、常時、工事の騒音と振動を計測機により測定し、自主的に設けた基準値（振動70dB、騒音80dB）を継続的に超えることがないように管理しております。

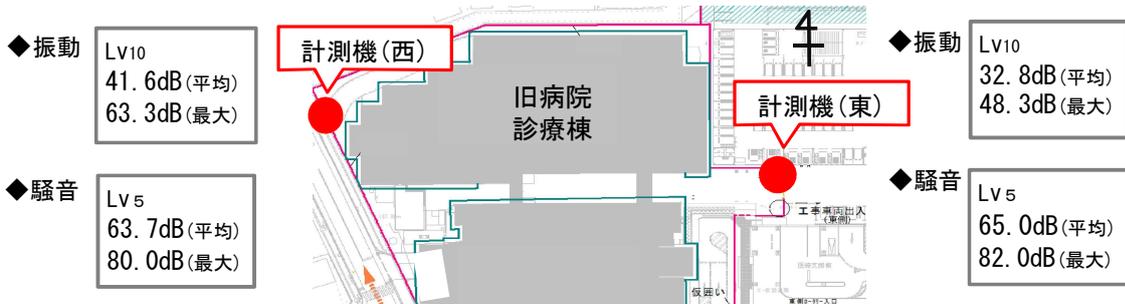

(測定期間：R5. 4. 16～R5. 5. 15)

※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は6月末を予定しています。

工事のお問い合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江
