

市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2023年9月号

■ 工事進捗および工程表

9月の主な作業内容は、先月に続いて診療棟の地階取壊し・埋戻しおよび病棟の上屋取壊しになります。建物上部に設置した重機による解体作業は9月上旬までの予定で、その後の作業では、重機を地上に設置して建物の解体を行っていきます。近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続き、安全対策を十分に行いながら工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

| 工事項目 | 8月 | | | 9月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|
| | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 診療棟 | 地階取壊し・埋戻し（スラブ解体、コア抜き） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | [作業期間の表示] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 病棟 | 足場盛替え・解体（取壊し進捗にあわせて） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7階取壊し・片付け | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 病棟取壊し（北面から） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




診療棟（地階） 解体状況



病棟（7階） 解体状況

● 振動・騒音の大きさについて

当現場では、工事における振動・騒音の基準値を、**振動70dB 騒音80dB**と定め、敷地の東西に設置した計測機により、常時測定しています。作業内容によって、基準値を一時的に超えてしまう場合がありますが、継続的に超えることがないように、振動・騒音の軽減に努めてまいります。

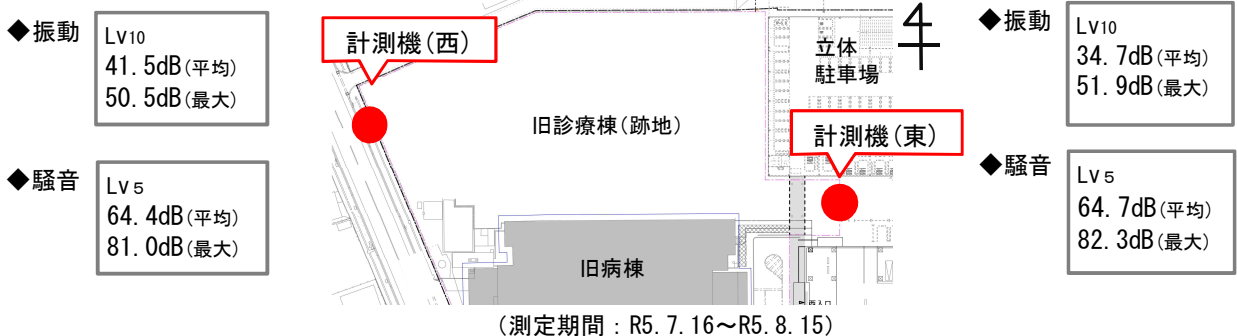

※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は9月末を予定しています。

工事のお問合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江

2023年8月発行
