

市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2023年10月号

■ 工事進捗および工程表

10月の主な作業内容は、先月に続いて診療棟の地階取壊し・埋戻しおよび病棟の上屋取壊しになります。病棟の取壊しは、地上に設置した腕の長い重機によって、平面を5つに区分けしたブロックごとに解体する計画となっており、現在は北側上屋の取壊し状況を、敷地外からもご覧いただけます。

引き続き、重機災害や墜落災害がないよう安全対策を十分に行いながら工事を進めてまいります。近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

工事項目	9月			10月																															
	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
診療棟	地階取壊し・埋戻し（スラブ解体、コア抜き）																																		
	[施工スケジュール表のセル]																																		
病棟	足場盛替え・解体（取壊し進捗にあわせて）																																		
	病棟上屋取壊し																																		
[施工スケジュール表のセル]																																			




診療棟（地階） 解体状況



病棟（北側） 解体状況

● 振動・騒音の大きさについて

当現場では、工事における振動・騒音の基準値を、**振動70dB** **騒音80dB**と定め、敷地の東西に設置した計測機により、常時測定しています。作業内容によって、基準値を一時的に超えてしまう場合がありますが、継続的に超えることがないように、振動・騒音の軽減に努めてまいります。

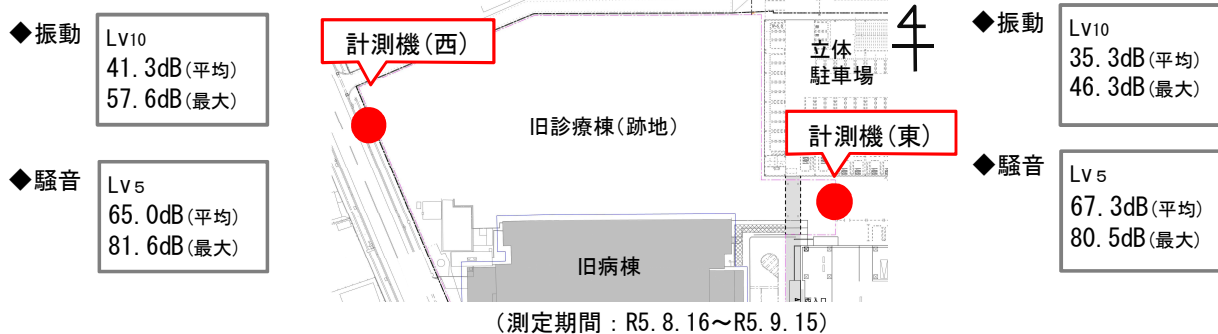

※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は10月末を予定しています。

工事のお問合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江
