

市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2023年11月号

■ 工事進捗および工程表

11月の主な作業内容は、先月に続いて診療棟の地階取壊し・埋戻しおよび病棟の上屋取壊しになります。現在取壊しを行っている北側上屋に引き続き、南側上屋にも取り掛かり、12月中旬には上屋の解体がすべて完了する予定です。今後とも、重機災害や墜落災害がないよう、安全対策を十分に行いながら工事を進めてまいります。近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

工事項目	10月			11月																														
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
診療棟	地階取壊し・埋戻し（スラブ解体、コア抜き）															山砂埋戻し																		
																				井戸工事（さく井作業）														
病棟	足場盛替え・解体（取壊し進捗にあわせて）																																	
	病棟上屋取壊し																																	




診療棟（地階） 解体状況



病棟（北側） 解体状況

● 振動・騒音の大きさについて

当現場では、工事における振動・騒音の基準値を、**振動70dB** **騒音80dB**と定め、敷地の東西に設置した計測機により、常時測定しています。作業内容によって、基準値を一時的に超えてしまう場合がありますが、継続的に超えることがないように、振動・騒音の軽減に努めてまいります。

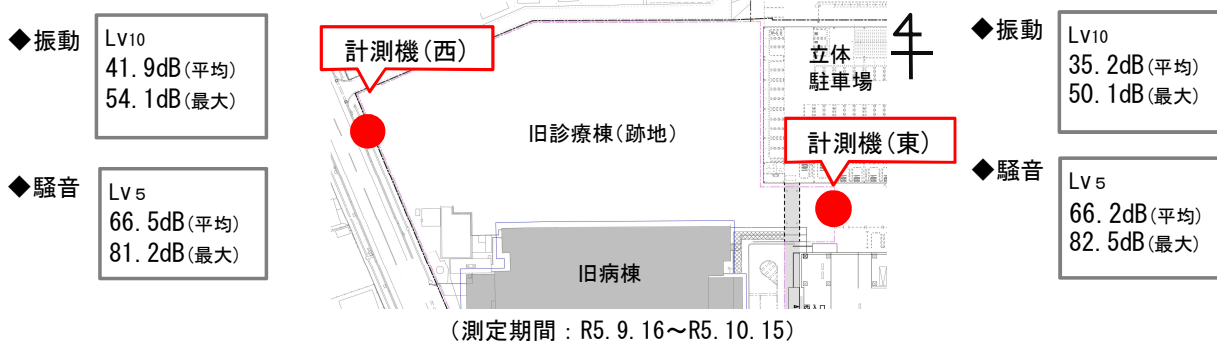

※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は11月末を予定しています。

工事のお問合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江
