

市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2023年1月号

■ 工事進捗および工程表

12月は主に内装材解体、外周養生足場組を行いました。1月は引き続きそれらの作業と並行して、解体用クレーンを工事エリアに搬入・配置するのに支障となる、渡り廊下、病棟風除室・北側跳ね出し部の取壊しを行います。解体用クレーンは、病棟の上階から発生した解体材を地上に降ろすために使用します。作業につきましては、騒音・振動に十分注意しながら進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

| 工事項目 | 12月 | | | | 1月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|----|----|----|----------------|---|---|---|---|---|---|-------|---|----|----|-------|----|---------|----|-------|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 診療棟 | 外周養生足場組 | | | | 外周養生足場組 | | | | | | | | | | | | | 外周養生足場組 | | | | 外周養生足場組 | | | | | | | | | | | | | |
| | 内装材解体 | | | | 内装材解体 | | | | | | | 内装材解体 | | | | 内装材解体 | | | | 内装材解体 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 渡り廊下取壊し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年末年始休暇 | | | | 届出対象特定工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 病棟 | | | | | 風除室取壊し、跳ね出し部解体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 内装材解体 | | | | | | | 内装材解体 | | | | 内装材解体 | | | | 内装材解体 | | | | | | | | | | | | | | | |




写真説明：照明機器類取外し



写真説明：屋外機冷媒ガス回収

■ 渡り廊下、病棟風除室・跳ね出し部

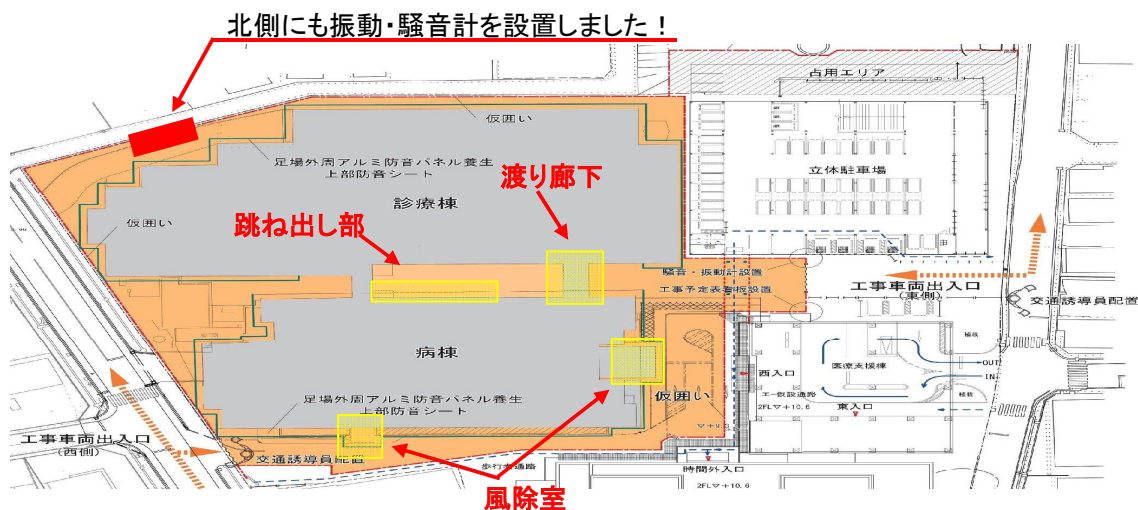

※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は1月末を予定しています。

工事のお問合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江

2022年12月 発行
