

市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2023年5月号

■ 工事進捗および工程表

診療棟内側の取壊し作業がほぼ終了し、5月上旬からは外側の躯体を取壊す作業が始まります。これまで防音壁の役割を兼ねていた外壁が徐々に取り壊されることから、工事の発生音がより感じ易くなるものと思われます。近隣の皆様には引き続きご迷惑をおかけしますが、これまで同様、振動・騒音の抑制に努めながら工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。※ゴールデンウィークは5/3から5/7まで工事を休業します。

工事項目	4月			5月																															
	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
診療棟	外周養生足場解体（解体の進みに合わせて）																																		
	上屋取壊し（5月末まで）																																		
	現場休業																																		
病棟	外部養生足場組																																		
	各階内部取壊し解体撤出																				屋上防水はぎ取り・取壊し準備														
	届出対象特定工事（カーテンウォール・外板除去）																																		



診療棟 解体状況




病棟 外部養生足場組

● 振動・騒音の大きさについて

当現場では、常時、工事の騒音と振動を計測機により測定し、自主的に設けた基準値（振動70dB、騒音80dB）を継続的に超えることがないように管理しております。

今後、毎月発行するこの「お知らせ」により、振動・騒音の測定値※を周知いたします。詳しいデータをご覧になりたい方は、下記の連絡先にお問い合わせください。

※測定値：環境省が定めた基準に基づいて算出した評価値です。測定期間内で最も大きい値と平均の値を掲載します。

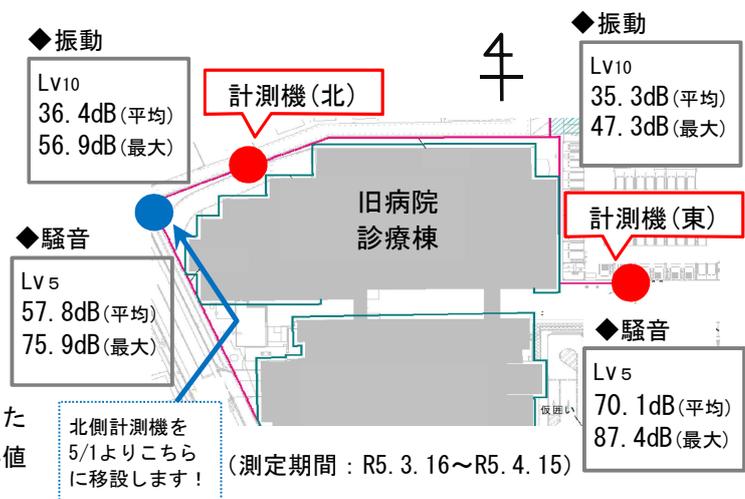

※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は5月末を予定しています。

工事のお問合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江

2023年4月発行
