

# 市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2024年3月号

## ■ 工事進捗および工程表

旧病院の上屋取壊し作業がすべて完了し、現在は地階の取壊し・埋戻しおよび既存の外構取壊しを行っております。3月からは、敷地外周部のブロック塀の取壊しや敷地東西における地盤面の高低差処理を目的とした補強土壁工事を進めていく予定です。近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、周辺への影響を最小限に留めるよう注意を払ってまいりますので、引き続き工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

工事項目	2月			3月																															
	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
解体工事	地階取壊し・埋戻し（山砂搬入）														オイルタンク・外周工作物取壊し																				
外構工事	北東側補強土壁工事														補強土壁2号工事																				
	渡り廊下基礎工事														北東側車路基礎工事																				



上屋解体状況




外構工事（土壁基礎）

## ■ 振動・騒音の大きさについて

当現場では、工事における振動・騒音の基準値を、振動70dB、騒音80dBと定め、敷地の東西に設置した計測機により、常時測定しています。作業内容によって、基準値を一時的に超えてしまう場合がありますが、継続的に超えることがないように、振動・騒音の軽減に努めてまいります。

	西側	東側
振動 (Lv10)	47.6dB(平均)	31.4dB(平均)
	62.4dB(最大)	68.0dB(最大)
騒音 (Lv5)	68.7dB(平均)	69.3dB(平均)
	82.4dB(最大)	82.5dB(最大)

(測定期間：R6.1.16～R6.2.15)

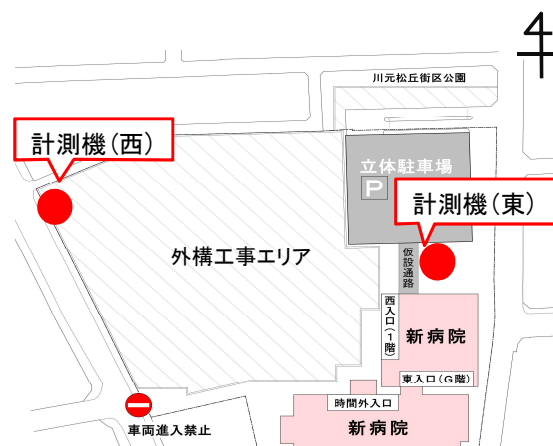

※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は3月末を予定しています。

## 工事のお問い合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体  
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江

2024年2月発行
